



**Finanziato
dall'Unione europea**
NextGenerationEU



PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA

MISSIONE 4: ISTRUZIONE E RICERCA

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle università

Investimento 1.3: Piano per le infrastrutture per lo sport nelle scuole

**REALIZZAZIONE NUOVA PALESTRA
AL SERVIZIO DELLA SCUOLA PRIMARIA DI BERBENNO DI VALTELLINA
CUP G71B22001270001**

COMMITTENTE
COMUNE DI BERBENNO DI VALTELLINA (SO)

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO
LUGLIO 2023

RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI

capogruppo mandatario
ARCHITETTO GIOVANNI VANOI
Lungo Mallero Cadorna, 64 23100 Sondrio Tel +39 0342 515106
giovannivanoi@zeroseistudio.it

mandanti
ARCHITETTO CLAUDIA GUSMEROLI
INGEGNERE PATRIZIO BONGIOLATTI
PERITO IND. CESARE GIARBA
PERITO IND. MARIO SALA TESCIA
INGEGNERE PAOLO GALLO

ELABORATI AMMINISTRATIVI

A.11

CRONOPROGRAMMA




ARCHITETTO GIOVANNI VANOI
Lungo Mallero Cadorna, 64 23100 Sondrio Tel +39 0342 515106
giovannivanoi@zeroseistudio.it

ARCHITETTO CLAUDIA GUSMEROLI
Lungo Mallero Cadorna, 64 23100 Sondrio Tel +39 0342 515106
claudiagusmeroli@zeroseistudio.it

CRONOPROGRAMMA

N. ord.		Attività	Inizio	Fine	Durata gg.
1		Allestimento cantiere, spostamento impianti ecc..	02/04/2024	07/04/2024	5
2		Scavi e demolizioni	07/04/2024	07/05/2024	30
3		Strutture edili fino al rustico	07/05/2024	06/07/2024	60
3		Impermeabilizzazioni e isolazioni	06/07/2024	15/08/2024	40
5		Opere edili interne	06/07/2024	04/09/2024	60
4		Impianti meccanici	15/07/2024	13/09/2024	60
4		Impianti elettrici	01/08/2024	15/09/2024	45
5		Finiture opere edili interne	10/09/2024	20/09/2024	10
6		Finiture opere impiantistiche	20/09/2024	30/09/2024	10
7		Finiture impiantistiche	30/09/2024	10/10/2024	10
8		Finiture generali e sistemazioni esterne	10/10/2024	19/10/2024	9

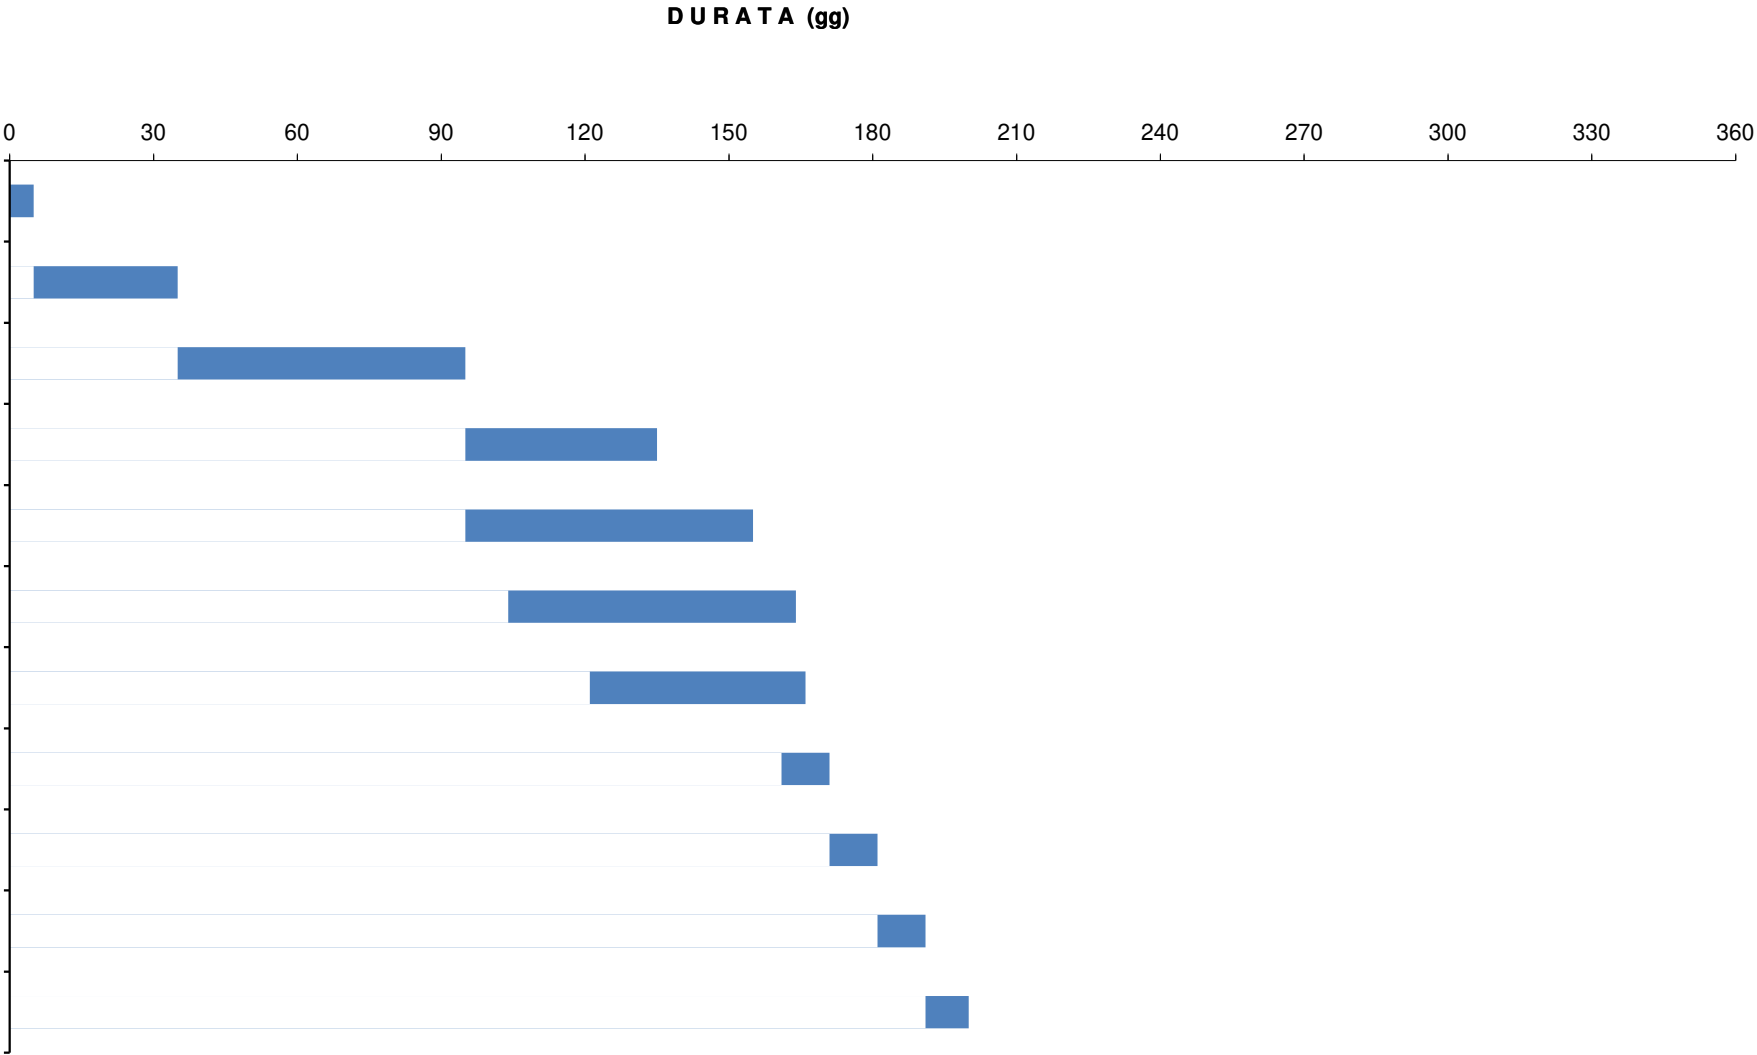

Inizio dei lavori

Fine lavori

TC

200

gg.

naturali consecutivi

0

gg

200

gg

