


## PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

Servizio ingegneria e architettura riqualificazione  
Castione centro

Proposta di intervento urbano  
CUP C54E17000130004

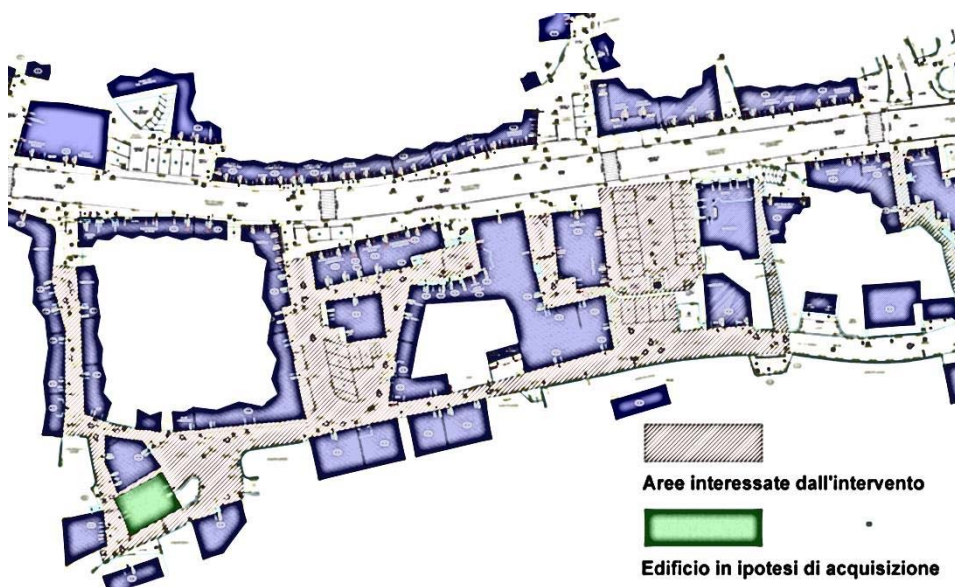

## CRONOPROGRAMMA

Comune di Castione della Presolana  
24020 - Piazza Roma, 3

[www.cortinovisperolari.com](http://www.cortinovisperolari.com)  
Vicolo Boesi, 5  
24029 Vertova (BG)  
T. 035711834  
M. [studio@cortinovisperolari.com](mailto:studio@cortinovisperolari.com)

ALL. H

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	Z	I	gg L	gg C	data Iniziale	data Finale
<b>ALLESTIMENTO GENERALE CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Allestimento di servizi igienico-assistenziali del cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Allestimento di servizi sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Realizzazione di impianto di messa a terra del cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Realizzazione di impianto idrico dei servizi igienico-assistenziali e sanitari del cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Realizzazione di impianto idrico del cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Realizzazione di impianto di protezione da scariche atmosferiche del cantiere	1	E	1	1	05/03/2018	05/03/2018
<b>FASE 1</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	05/03/2018	05/03/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	05/03/2018	05/03/2018
<b>OPERE</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	1	1	06/03/2018	06/03/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	2	2	07/03/2018	08/03/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	4	09/03/2018	12/03/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	13/03/2018	13/03/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	14/03/2018	14/03/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	15/03/2018	15/03/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	16/03/2018	16/03/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	E	1	1	19/03/2018	19/03/2018
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	20/03/2018	20/03/2018
Posa di cavidotto	1	1	2	2	21/03/2018	22/03/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	23/03/2018	23/03/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	5	5	26/03/2018	30/03/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	1	2	2	03/04/2018	04/04/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	1	1	1	04/04/2018	04/04/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	6	8	05/04/2018	12/04/2018
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	13/04/2018	13/04/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	13/04/2018	13/04/2018
<b>FASE 2</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	16/04/2018	16/04/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	16/04/2018	16/04/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	16/04/2018	16/04/2018
<b>OPERE</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	1	1	17/04/2018	17/04/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	2	2	17/04/2018	18/04/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	18/04/2018	19/04/2018

Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	20/04/2018	20/04/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	20/04/2018	20/04/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	23/04/2018	23/04/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	24/04/2018	24/04/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	26/04/2018	26/04/2018
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	26/04/2018	26/04/2018
Posa di cavidotto	1	1	2	2	26/04/2018	27/04/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	2	4	27/04/2018	30/04/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	4	5	30/04/2018	04/05/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	1	2	2	03/05/2018	04/05/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	1	1	1	04/05/2018	04/05/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	4	6	04/05/2018	09/05/2018
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	10/05/2018	10/05/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	10/05/2018	10/05/2018
<b>FASE 3</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	11/05/2018	11/05/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	11/05/2018	11/05/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	11/05/2018	11/05/2018
<b>OPERE</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	2	2	14/05/2018	15/05/2018
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	2	2	15/05/2018	16/05/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	16/05/2018	17/05/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	18/05/2018	18/05/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	21/05/2018	21/05/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	22/05/2018	22/05/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	2	2	23/05/2018	24/05/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	2	2	24/05/2018	25/05/2018
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	28/05/2018	28/05/2018
Posa di cavidotto	1	1	1	1	29/05/2018	29/05/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	30/05/2018	30/05/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	5	7	31/05/2018	06/06/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	1	2	2	05/06/2018	06/06/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	1	1	1	06/06/2018	06/06/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	9	11	04/06/2018	14/06/2018
Messa a dimora di piante	1	1	1	1	14/06/2018	14/06/2018
Formazione di tappeto erboso	1	1	1	1	14/06/2018	14/06/2018
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	15/06/2018	15/06/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	15/06/2018	15/06/2018
<b>FASE 4</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	18/06/2018	18/06/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	18/06/2018	18/06/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	18/06/2018	18/06/2018
<b>OPERE</b>						
Taglio di asfalto di carreggiata stradale	1	1	2	2	19/06/2018	20/06/2018

Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	2	2	20/06/2018	21/06/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	21/06/2018	22/06/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	25/06/2018	26/06/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	27/06/2018	28/06/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	28/06/2018	28/06/2018
Realizzazione della carpenteria per sottoservizi in c.a.	1	1	2	4	29/06/2018	02/07/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per sottoservizi in c.a.	1	1	2	2	02/07/2018	03/07/2018
Getto in calcestruzzo per sottoservizi in c.a.	1	1	1	1	04/07/2018	04/07/2018
Posa di cavidotto	1	1	2	2	04/07/2018	05/07/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	05/07/2018	05/07/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	5	7	05/07/2018	11/07/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	1	2	2	10/07/2018	11/07/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	1	1	1	11/07/2018	11/07/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	7	9	11/07/2018	19/07/2018
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	20/07/2018	20/07/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	20/07/2018	20/07/2018
<b>FASE 5</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	23/07/2018	23/07/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	23/07/2018	23/07/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	23/07/2018	23/07/2018
<b>OPERE</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	2	2	24/07/2018	25/07/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	25/07/2018	26/07/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	2	2	26/07/2018	27/07/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	30/07/2018	30/07/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	30/07/2018	30/07/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	3	3	31/07/2018	02/08/2018
Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	03/08/2018	03/08/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	1	1	1	06/08/2018	06/08/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	1	1	1	06/08/2018	06/08/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	5	5	06/08/2018	10/08/2018
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	10/08/2018	10/08/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	10/08/2018	10/08/2018
<b>FASE 6</b>						
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>						
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1	1	13/08/2018	13/08/2018
Realizzazione della viabilità del cantiere	1	1	1	1	13/08/2018	13/08/2018
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	1	1	1	13/08/2018	13/08/2018
<b>OPERE</b>						
Asportazione di strato di usura e collegamento	1	1	1	1	14/08/2018	14/08/2018
Rimozione di cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	1	1	16/08/2018	16/08/2018
Realizzazione della carpenteria per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	17/08/2018	17/08/2018
Lavorazione e posa ferri di armatura per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	17/08/2018	17/08/2018
Getto in calcestruzzo per opere d'arte in lavori stradali	1	1	1	1	20/08/2018	20/08/2018
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	1	2	2	21/08/2018	22/08/2018

Pozzetti di ispezione e opere d'arte	1	1	1	1	24/08/2018	24/08/2018
Posa di pali per pubblica illuminazione	2	1	1	1	27/08/2018	27/08/2018
Montaggio di apparecchi illuminanti a risparmio energetico	2	1	1	1	27/08/2018	27/08/2018
Formazione di manto di usura e collegamento	1	1	4	4	27/08/2018	30/08/2018
<b>SMOBILIZZO CANTIERE</b>						
Pulizia generale dell'area di cantiere	1	1	1	1	31/08/2018	31/08/2018
Smobilizzo del cantiere	1	1	1	1	31/08/2018	31/08/2018

**LEGENDA:**

Z = ZONA

*Elenco delle Zone attribuite alle Fasi del Programma Lavori:*

1) = Opere Edili

2) = Opere impiantistica

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = Opere edili

2) = Opere di impiantistica

E <Nessuna impresa definita>

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

