


# PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE E FUNZIONALE DEL CAMPO POLIVALENTE PRESSO IL CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI ROVETTA (BG)

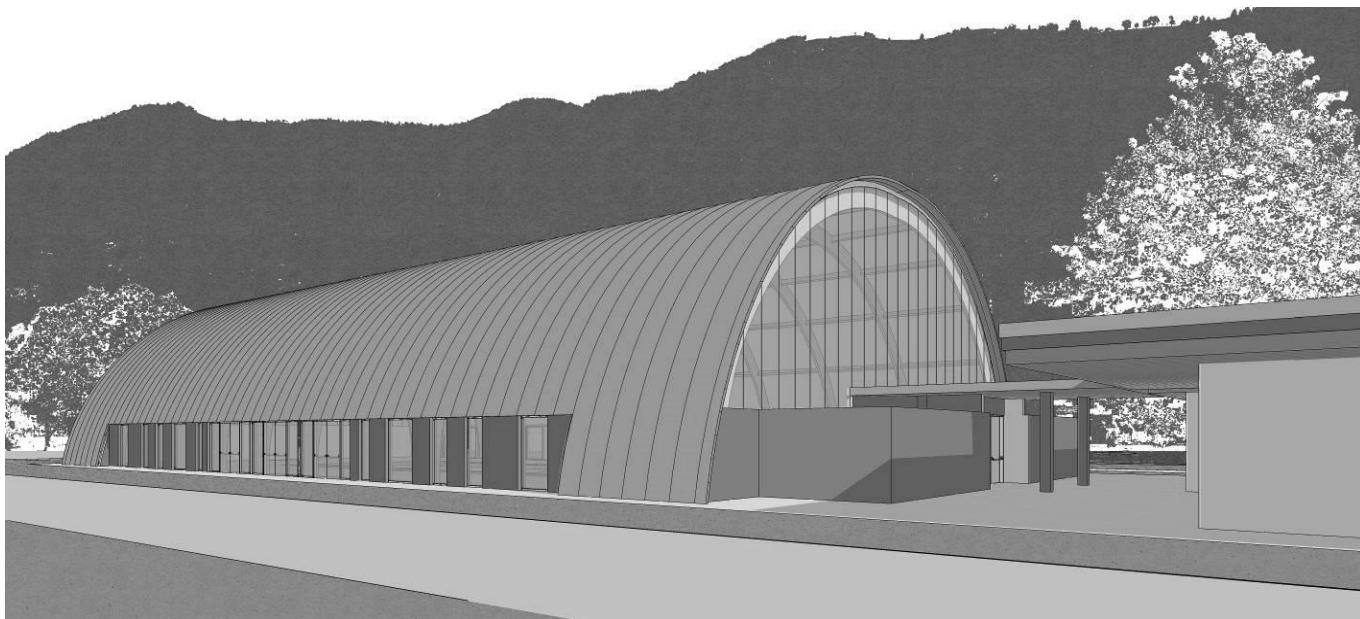

## COMMITTENTE:

Comune di Rovetta (BG)

studio**28**architettura  
a r c h i t e t t i   a s s o c i a t i

24128 Bergamo, via Nullo 28/a  
Tel. 035.243747 Fax 035.248074  
Info@studio28a.it

### Arch. Alberto Roscini

Iscritto Albo Arch. Bg n° 645

### Arch. Francesco Di Prisco

Iscritto Albo Arch. Bg n° 1493

### Arch. Marco Benedetti

Iscritto Albo Arch. Bg. n° 2156

# ALLEGATO "A"

**Comune di Rovetta**  
Provincia di Bg

## DIAGRAMMA DI GANTT

### **cronoprogramma dei lavori**

(Allegato XV e art. 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)  
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

**OGGETTO:** Progetto esecutivo per i lavori di riqualificazione strutturale e funzionale del campo polivalente presso il Centro Sportivo Comunale "Gian Paolo Marinoni"  
**COMMITTENTE:** AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI ROVETTA.  
**CANTIERE:** Viale Papa Giovanni XXIII, Rovetta (Bg)

Rovetta, Settembre 2022

### **IL COORDINATORE DELLA SICUREZZA**

(Studio 28 architettura \$EMPTY\_CSP\_03\$ Arch. Francesco Di Prisco)

*per presa visione*

### **IL COMMITTENTE**

(SINDACO PRO-TEMPORE \$EMPTY\_COM\_10\$ MAURO MARINONI )

**Studio 28 architettura \$EMPTY\_CSP\_03\$ Arch. Francesco Di Prisco**  
Via F.Nullo, 28/a  
24128 BERGAMO (BG)  
Tel.: 035. 243747 - Fax: 035.248074  
E-Mail: info@studio28a.it

CerTus by Guido Cianciulli - Copyright ACCA software S.p.A.

# TABELLA ANALITICA GANTT

Tabella Analitica Gantt

FASI DI LAVORO	I	gg L	gg C
<b>ALLESTIMENTO DEL CANTIERE</b>			
Allestimento di cantiere	1	2	2
Allestimento di depositi, zone per lo stoccaggio dei materiali e per gli impianti fissi	1	2	2
Realizzazione della recinzione e degli accessi al cantiere	1	1	1
Realizzazione di impianto elettrico del cantiere	4	1	1
<b>REALIZZAZIONE INTERVENTI</b>			
Rimozione dei generatori di aria calda	1	2	2
Rimozione di attrezzature sportive	1	1	1
Rimozione di scossaline e canali di gronda	1	1	1
Rimozione di telo di copertura in PVC	1	3	3
Demolizione di strutture in c.a. eseguita con mezzi meccanici	1	3	5
Rimozione di massetto	1	11	15
Scavo di sbancamento	1	6	8
Scavo a sezione obbligata	1	3	3
Realizzazione della carpenteria per le strutture in fondazione con casseforme riutilizzabili	1	5	8
Lavorazione e posa ferri di armatura per le strutture in fondazione	1	6	8
	1	9	13
Getto in calcestruzzo per le strutture in fondazione	1	2	2
Perforazioni per spinottature	1	5	7
Posa ferri di armatura per spinottature	1	5	7
Realizzazione della carpenteria per le strutture in elevazione con casseforme riutilizzabili	1	8	10
Getto in calcestruzzo per le strutture in elevazione	1	2	2
Montaggio di lastre prefabbricate in c.a. per solai	1	3	3
Lavorazione e posa ferri di armatura per solaio in c.a. o prefabbricato	1	1	1
Montaggio travi in legno lamellare	2	14	21
Impermeabilizzazione di pareti controterra	1	3	3
Realizzazione di vespaio aerato con elementi in plastica	1	9	13
Realizzazione di pavimentazione industriale a spolvero	1	5	7
Posa di reti elettrosaldate	1	1	1
Realizzazione di murature portanti	1	6	8
Montaggio di copertura in lamiera grecata	7	7	9
Montaggio di scossaline e canali di gronda	7	2	2
Montaggio di facciata in policarbonato	6	5	5
Applicazione esterna di pannelli isolanti in materiali polimerici su superfici verticali	1	5	9
Realizzazione di pareti divisorie interne in cartongesso	1	4	6
Formazione intonaci interni (tradizionali)	1	2	4
Formazione di massetto per pavimenti interni	1	3	4
Montaggio di serramenti esterni	9	2	5
Posa di pavimentazione sintetica per impianti sportivi	3	5	7
Posa di attrezzature sportive	8	1	1
Posa di ringhiere e parapetti	11	1	1
Tinteggiatura di superfici interne	12	2	2

Tabella Analitica Gantt

Tinteggiatura di superfici esterne	12	2	4
Montaggio di porte interne	E	2	2
Applicazione interna di pannelli o stuoie isolanti in fibre minerali su superfici verticali	10	10	14
Scavo a sezione ristretta	1	6	8
Realizzazione della rete idrica e degli attacchi per impianto antincendio	5	5	7
Posa di conduttura fognaria in materie plastiche	1	4	6
Cordoli, zanelle e opere d'arte	1	3	3
Posa dei generatori per riscaldamento	5	4	8
Posa di pavimenti per esterni in masselli	1	12	16
Realizzazione di impianto elettrico interno	4	12	19
Montaggio di apparecchi illuminanti	4	8	10
Realizzazione di impianto solare fotovoltaico	4	17	27
Formazione di tappeto erboso	13	3	5
<b>SMOBILIZZO DEL CANTIERE</b>			
Smobilizzo del cantiere	1	4	4

**LEGENDA:**

I = IMPRESA

*Elenco delle Imprese presenti nel Programma Lavori:*

1) = IMPRESA EDILE

2) = DITTA LEGNO LAMELLARE

3) = DITTA PAVIMENTAZIONI SPORTIVE

4) = DITTA IMPIANTI ELETTRICI

5) = DITTA IMPIANTI MECCANICI

6) = DITTA FACCIAE POLICARBONATO

7) = LATTONIERE

8) = DITTA ATTREZZATURE SPORTIVE

9) = SERRAMENTISTA

10) = DITTA ISOLAMENTI ACUSTICI

11) = FABBRO

12) = PITTORE

13) = GIARDINIERE

E &lt;Nessuna impresa definita&gt;

gg C = DURATA, espressa in giorni naturali e consecutivi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro

gg L = DURATA, espressa in giorni lavorativi, per lo svolgimento della Fase di Lavoro



