

**PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA , DI
RIELABORAZIONI DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA VALUTAZIONE
DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLIINTERVENTI DI
EDILIZIA SCOLASTICA**

.


Premessa

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019 – 2021 della Provincia di Brescia, nella Sezione Speciale dedicata al Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, prevede, all'articolo 7 - Attività Programmata nel Triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia scolastica. I dati riportati nel presente documento sono una elaborazione effettuata dal Settore dell'Edilizia Scolastica e Direzionale.

Brescia, 27/11/2019


CONFRONTO COSTI

PROGETTO - CONSUNTIVO

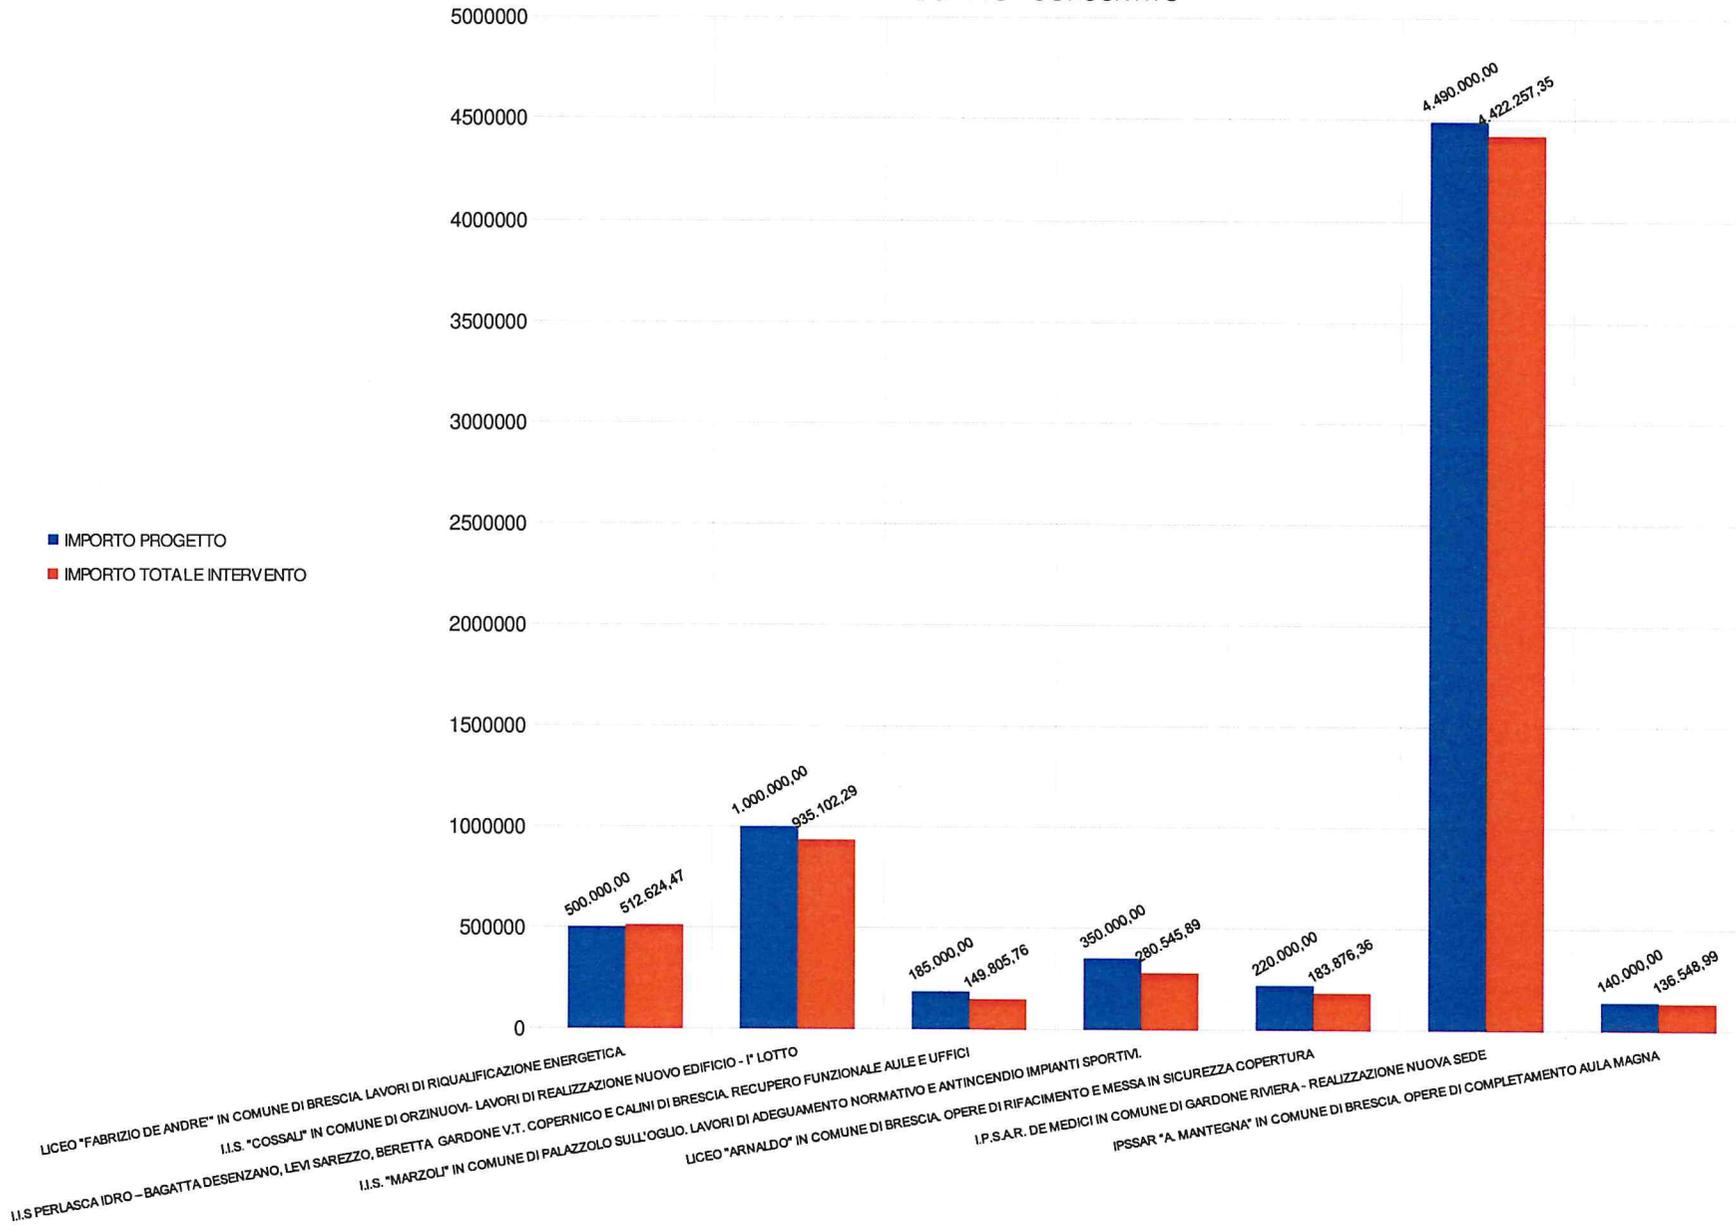

CONFRONTO TEMPI

PROGETTUALI - REALIZZATIVI

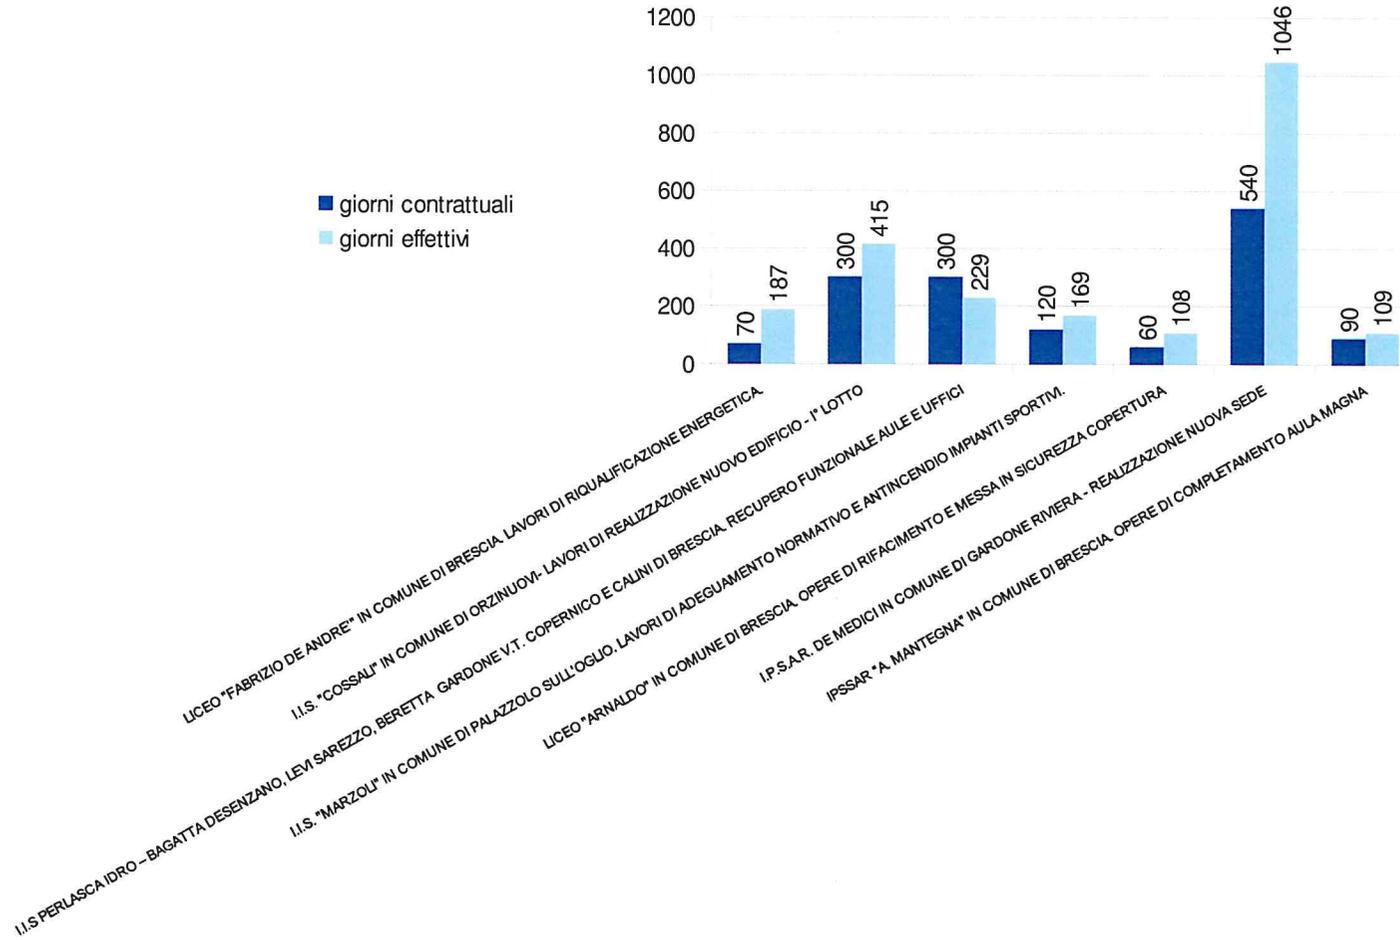

| C.I.G. | OGGETTO | APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO | | APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE | | AGGIUDICATARIO | | INIZIO LAVORI | FINE LAVORI | CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE/COLLAUDO | | IMPORTO LORDO LAVORI | IMPORTO TOTALE INTERVENTO | INDICATORI | |
|------------|--|---------------------------------|------|-----------------------------|------|--|-------------|---------------|-------------|---|------|----------------------|---------------------------|---------------------------|--------------|
| | | DEL | N° | DEL | N° | | C.F./P.IVA | DEL | DEL | DEL | N° | €. | €. | UNITA' MISURA | DI QUANTITA' |
| 7008639FDA | LICEO "FABRIZIO DE ANDRE" IN COMUNE DI BRESCIA. LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA. | 28/12/16 | 1546 | 28/6/17 | 687 | DVT S.R.L. | 03828270987 | 31/05/2018 | 04/12/2018 | 6/3/19 | 337 | 423.339,42 | 512.624,47 | cappotto mq | 3500 |
| | | | | | | | | | | | | | | copertura mq | 1100 |
| | | | | | | | | | | | | | | tinteggiatura mnq | 8000 |
| 6812651972 | I.I.S. "COSSALI" IN COMUNE DI ORZINUOVI- LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVO EDIFICIO - I° LOTTO | 29/9/16 | 1069 | 28/12/16 | 1579 | COSTRUZIONI FERRACIN SRL | 03383330275 | 09/08/2017 | 28/09/2018 | 3/4/19 | 479 | 768.551,37 | 935.102,29 | mq | 899 |
| 7432543882 | ISTITUTI "PERLASCA" NEL COMUNE DI IDRO, "BAGATTA" NEL COMUNE DI DESENZANO D/G, "LEVI" NEL COMUNE DI SAREZZO E "BERETTA" NEL COMUNE DI GARDONE V.T. COPERNICO E CALINI NEL COMUNE DI BRESCIA. RECUPERO FUNZIONALE AULE E UFFICI | 19/12/17 | 1606 | 7/6/19 | 701 | TECNO SRL | 3732590132 | 27/06/2018 | 11/2/219 | 16/5/19 | 667 | 120.350,62 | 149.805,76 | mq | 20000 |
| 7454513AB9 | I.I.S. "MARZOLI" IN COMUNE DI PALAZZOLO SULL'OGLIO. LAVORI DI ADEGUAMENTO NORMATIVO E ANTINCENDIO IMPIANTI SPORTIVI. | 19/3/18 | 309 | 9/7/18 | 884 | ITER SRL | 5365500650 | 20/09/2018 | 08/03/2019 | 5/6/19 | 789 | 189.265,89 | 280.545,89 | tinteggiature mq | 750 |
| | | | | | | | | | | | | | | tramezze e cartongessi mq | 300 |
| 7555439181 | LICEO "ARNALDO" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI RIFACIMENTO E MESSA IN SICUREZZA COPERTURA | 04/06/2019 | 684 | 19/09/2018 | 1226 | EDILTRE SRL | 1576360174 | 13/11/2018 | 01/03/2019 | 18/07/2019 | 1069 | 135.349,15 | 183.876,36 | recupero facciate mq | 363 |
| | | | | | | | | | | | | | | copertura mq | 489 |
| 5556349C3C | I.P.S.A.R. DE MEDICI IN COMUNE DI GARDONE RIVIERA - REALIZZAZIONE NUOVA SEDE | 21/01/2014 | 15 | 18/04/2014 | 401 | BISERNI COSTRUZIONI SRL | 2003020357 | 19/06/2014 | 30/04/2017 | 01/07/2019 | 956 | 3.615.048,92 | 4.422.257,35 | mc | 14912 |
| 7521463B9C | IPSSAR "A. MANTEGNA" IN COMUNE DI BRESCIA. OPERE DI COMPLETAMENTO AULA MAGNA | 10/04/18 | 418 | 25/10/18 | 1432 | SANGREGORIO SRL - Società Unipersonale | 05279280969 | 18/03/19 | 05/07/19 | 24/10/19 | 1692 | 110.266,85 | 136.548,99 | mq | 356 |
