

**PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DI
RIELABORAZIONE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE REALIZZATI NELL'ANNO 2019**

Premessa


Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2020-2022 della Provincia di Brescia, nella sezione speciale dedicata al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevede, all'art. 7 – Attività programmata nel triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale. I dati riportati nel presente documento sono una elaborazione effettuata dal Settore delle Strade e dei Trasporti, competente in tema di edilizia stradale.

Brescia, 29/11/2020

**INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE
CONCLUSI DAL 1/1/2020 AL 30/11/2020**

CIG	INTERVENTO	APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO DEL	APPROVAZIONE AGGIUDICAZIONE DEL	AGHGIUDICATARIO	C.FISCALE	INIZIO LAVORI	FINE LAVORI	APPROVAZIONE CRE COLLAUDO DEL	IMPORTO LORDO LAVORI	COSTO GLOBALE INTERVENTO	UNITA MISURA	QUANTITA'
71190054C5	BITUMATURA STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI ANNO 2017 - LOTTO 4	06/07/2017	27/03/2018	BONZI	03337610178	23/07/2018	17/12/2018	27/02/2020	909.742,13 €	915.328,22 €	MQ	127.240,00
7229047E4A	S.P. BS 668 - LENESE - LAVORI URGENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL MANUFATTO IN SOVRAPPASSO ALLA S.P. 33 NEL COMUNE DI MANERBIO	09/10/2017	09/10/2017	NUOVE INIZIATIVE	03581140179	06/10/2017	14/12/2018	03/03/2020	181.555,25 €	162.438,88 €	MQ	131,00
7637478639	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA PROTEZIONE DEI VERSANTI	21/08/2018	09/01/2019	RO.GU. Costruzioni srl	02995080799	16/04/2019	18/11/2019	12/02/2020	1.119.371,11 €	1.132.657,52 €	MQ	5.350,00
7867552D49	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE DELLA RETE DI INTERESSE REGIONALE: SP BS 236 - SP BS 668 - SP BS 11 "TANGENZIALE SUD DI BRESCIA" - contratto applicativo di accordo quadro	12/04/2019	12/04/2019	r.t.i. NOVASTRAD/Gruppo Adige Bitumi Spa, Frantoio Fondovalle Srl e Sias Spa	03224280986	17/04/2019	27/07/2019	15/04/2020	1.449.217,63 €	1.791.170,05 €	MQ	54.900,00
7989912BF4	MANUTENZIONE STRAORDINARIA URGENTE DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE NEL TRATTO DELLA SPBS 345 "DELLE TRE VALLI" DAL KM 68+600 AL KM 70+200, IN LOCALITA' CAMPOLARO NEI COMUNI DI BRENO E BIENNO - 3ø APPLICATIVO ACCORDO QUADRO	01/08/2019	01/08/2019	r.t.i. NOVASTRAD/Gruppo Adige Bitumi Spa, Frantoio Fondovalle Srl e Sias Spa	03224280986	01/08/2019	13/08/2019	28/01/2020	73.314,76 €	89.443,79 €	MQ	6.631,00
7725979F8C	REALIZZAZIONE NELL'AMBITO DELLA CICLOVIA DELL'OGGIO-GREENWAY - DEL COLLEGAMENTO ALLE STAZIONI FERROVIARIO DI BRENO E MALENGO	18/12/2018	21/05/2019	CARPENTERIA GIUDICARIESE di Marini Narciso & C. Sas	00412120222	17/06/2019	19/11/2019	24/07/2020	186.499,95 €	234.252,37 €	ML	50,00
801251046C	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE PAVIMENTAZIONI BITUMINOSE DI STRADE DELLA RETE DI INTERESSE REGIONALE: SP EX SS 510 "SEBINA ORIENTALE" - SP 19 "CONCESIO-OSPITALETTO-CAPRIANO D/C" - SP 235 "ORCEANA" - 4° contratto applicativo di accordo quadro	30/08/2019	30/08/2019	r.t.i. NOVASTRAD/Gruppo Adige Bitumi Spa, Frantoio Fondovalle Srl e Sias Spa	03224280986	16/09/2019	09/11/2019	10/07/2020	2.080.734,08 €	2.106.855,04 €	MQ	144.300,00

SCOSTAMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE

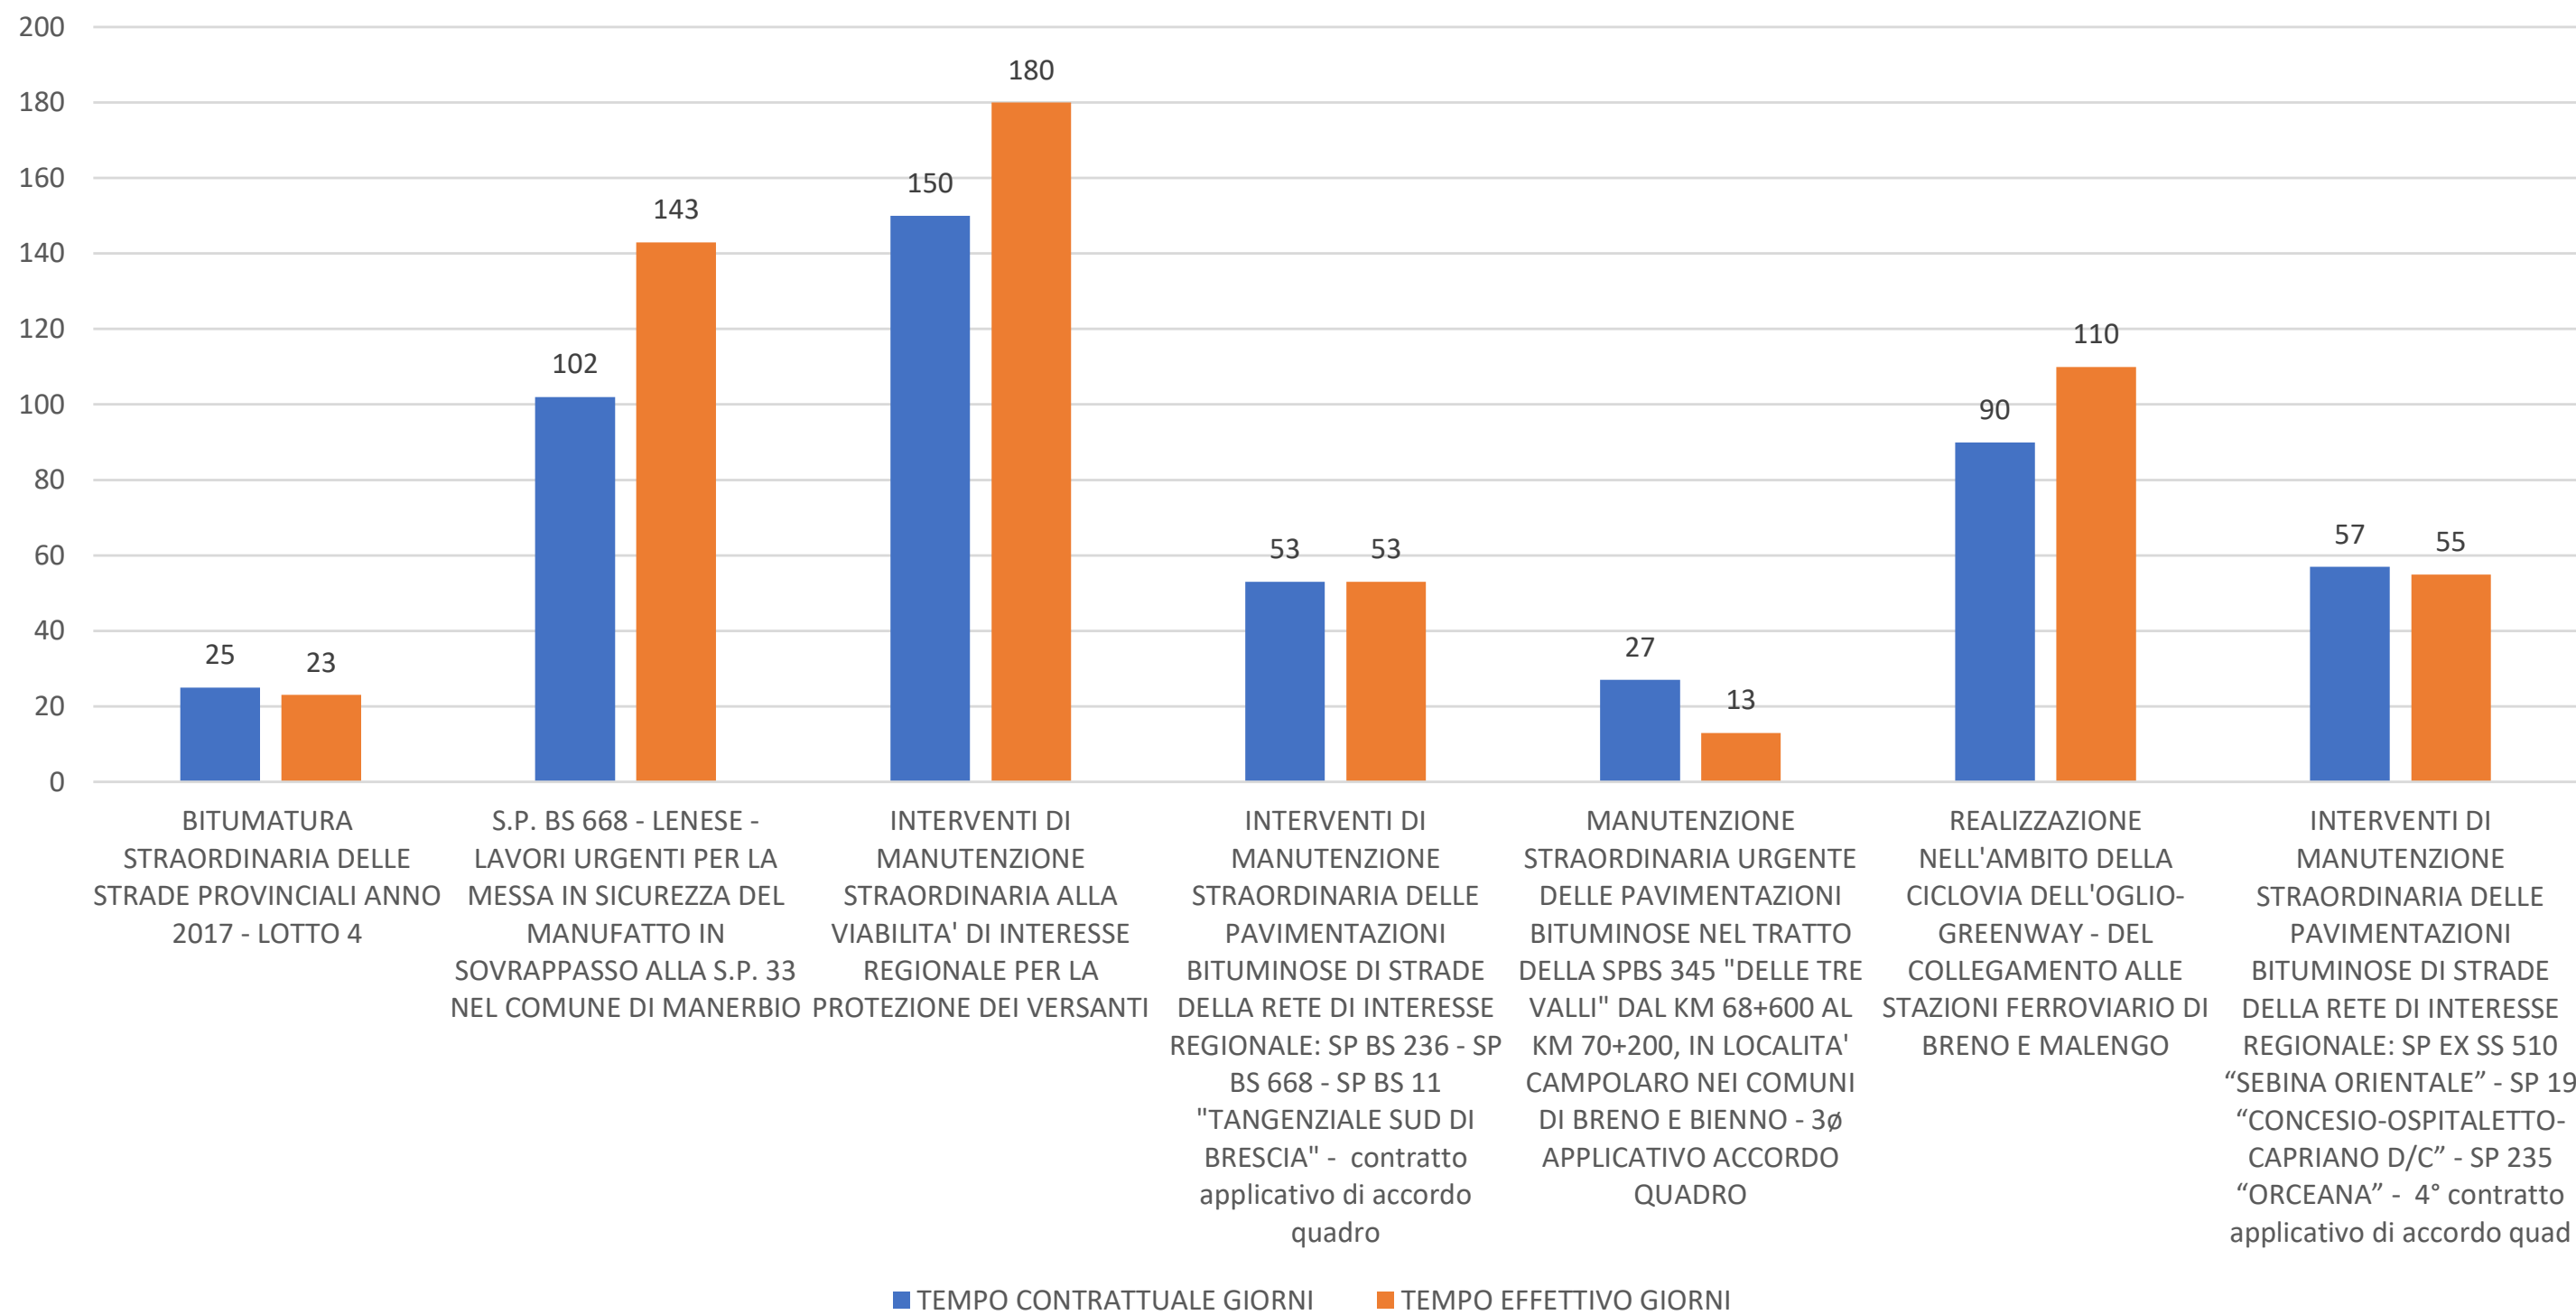

SCOSTAMENTO COSTI DI REALIZZAZIONE

