


**PUBBLICAZIONE, ANCHE CON RICORSO ALLA FORMA GRAFICA, DI
RIELABORAZIONE DEGLI INDICATORI SIGNIFICATIVI PER LA
VALUTAZIONE DEL RISPETTO COSTI/TEMPI DI REALIZZAZIONE DEGLI
INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE REALIZZATI NELL'ANNO 2021**

Premessa

Il piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2021-2023 della Provincia di Brescia, nella sezione speciale dedicata al programma triennale per la trasparenza e l'integrità, prevede, all'art. 7 – Attività programmata nel triennio – quale misura di trasparenza rafforzata, la pubblicazione annuale, anche con ricorso alla forma grafica, di rielaborazioni degli indicatori significativi per la valutazione del rispetto costi/tempi di realizzazione di interventi di edilizia stradale. I dati riportati nel presente documento sono una elaborazione effettuata dal Settore delle Strade e dei Trasporti, competente in tema di edilizia stradale.


Brescia, 30/11/2021

OPERE CONCLUSE DALL'1/1/2021 AL 30/11/2021 - CONFRONTO COSTI PREVISTI - COSTI EFFETTIVI

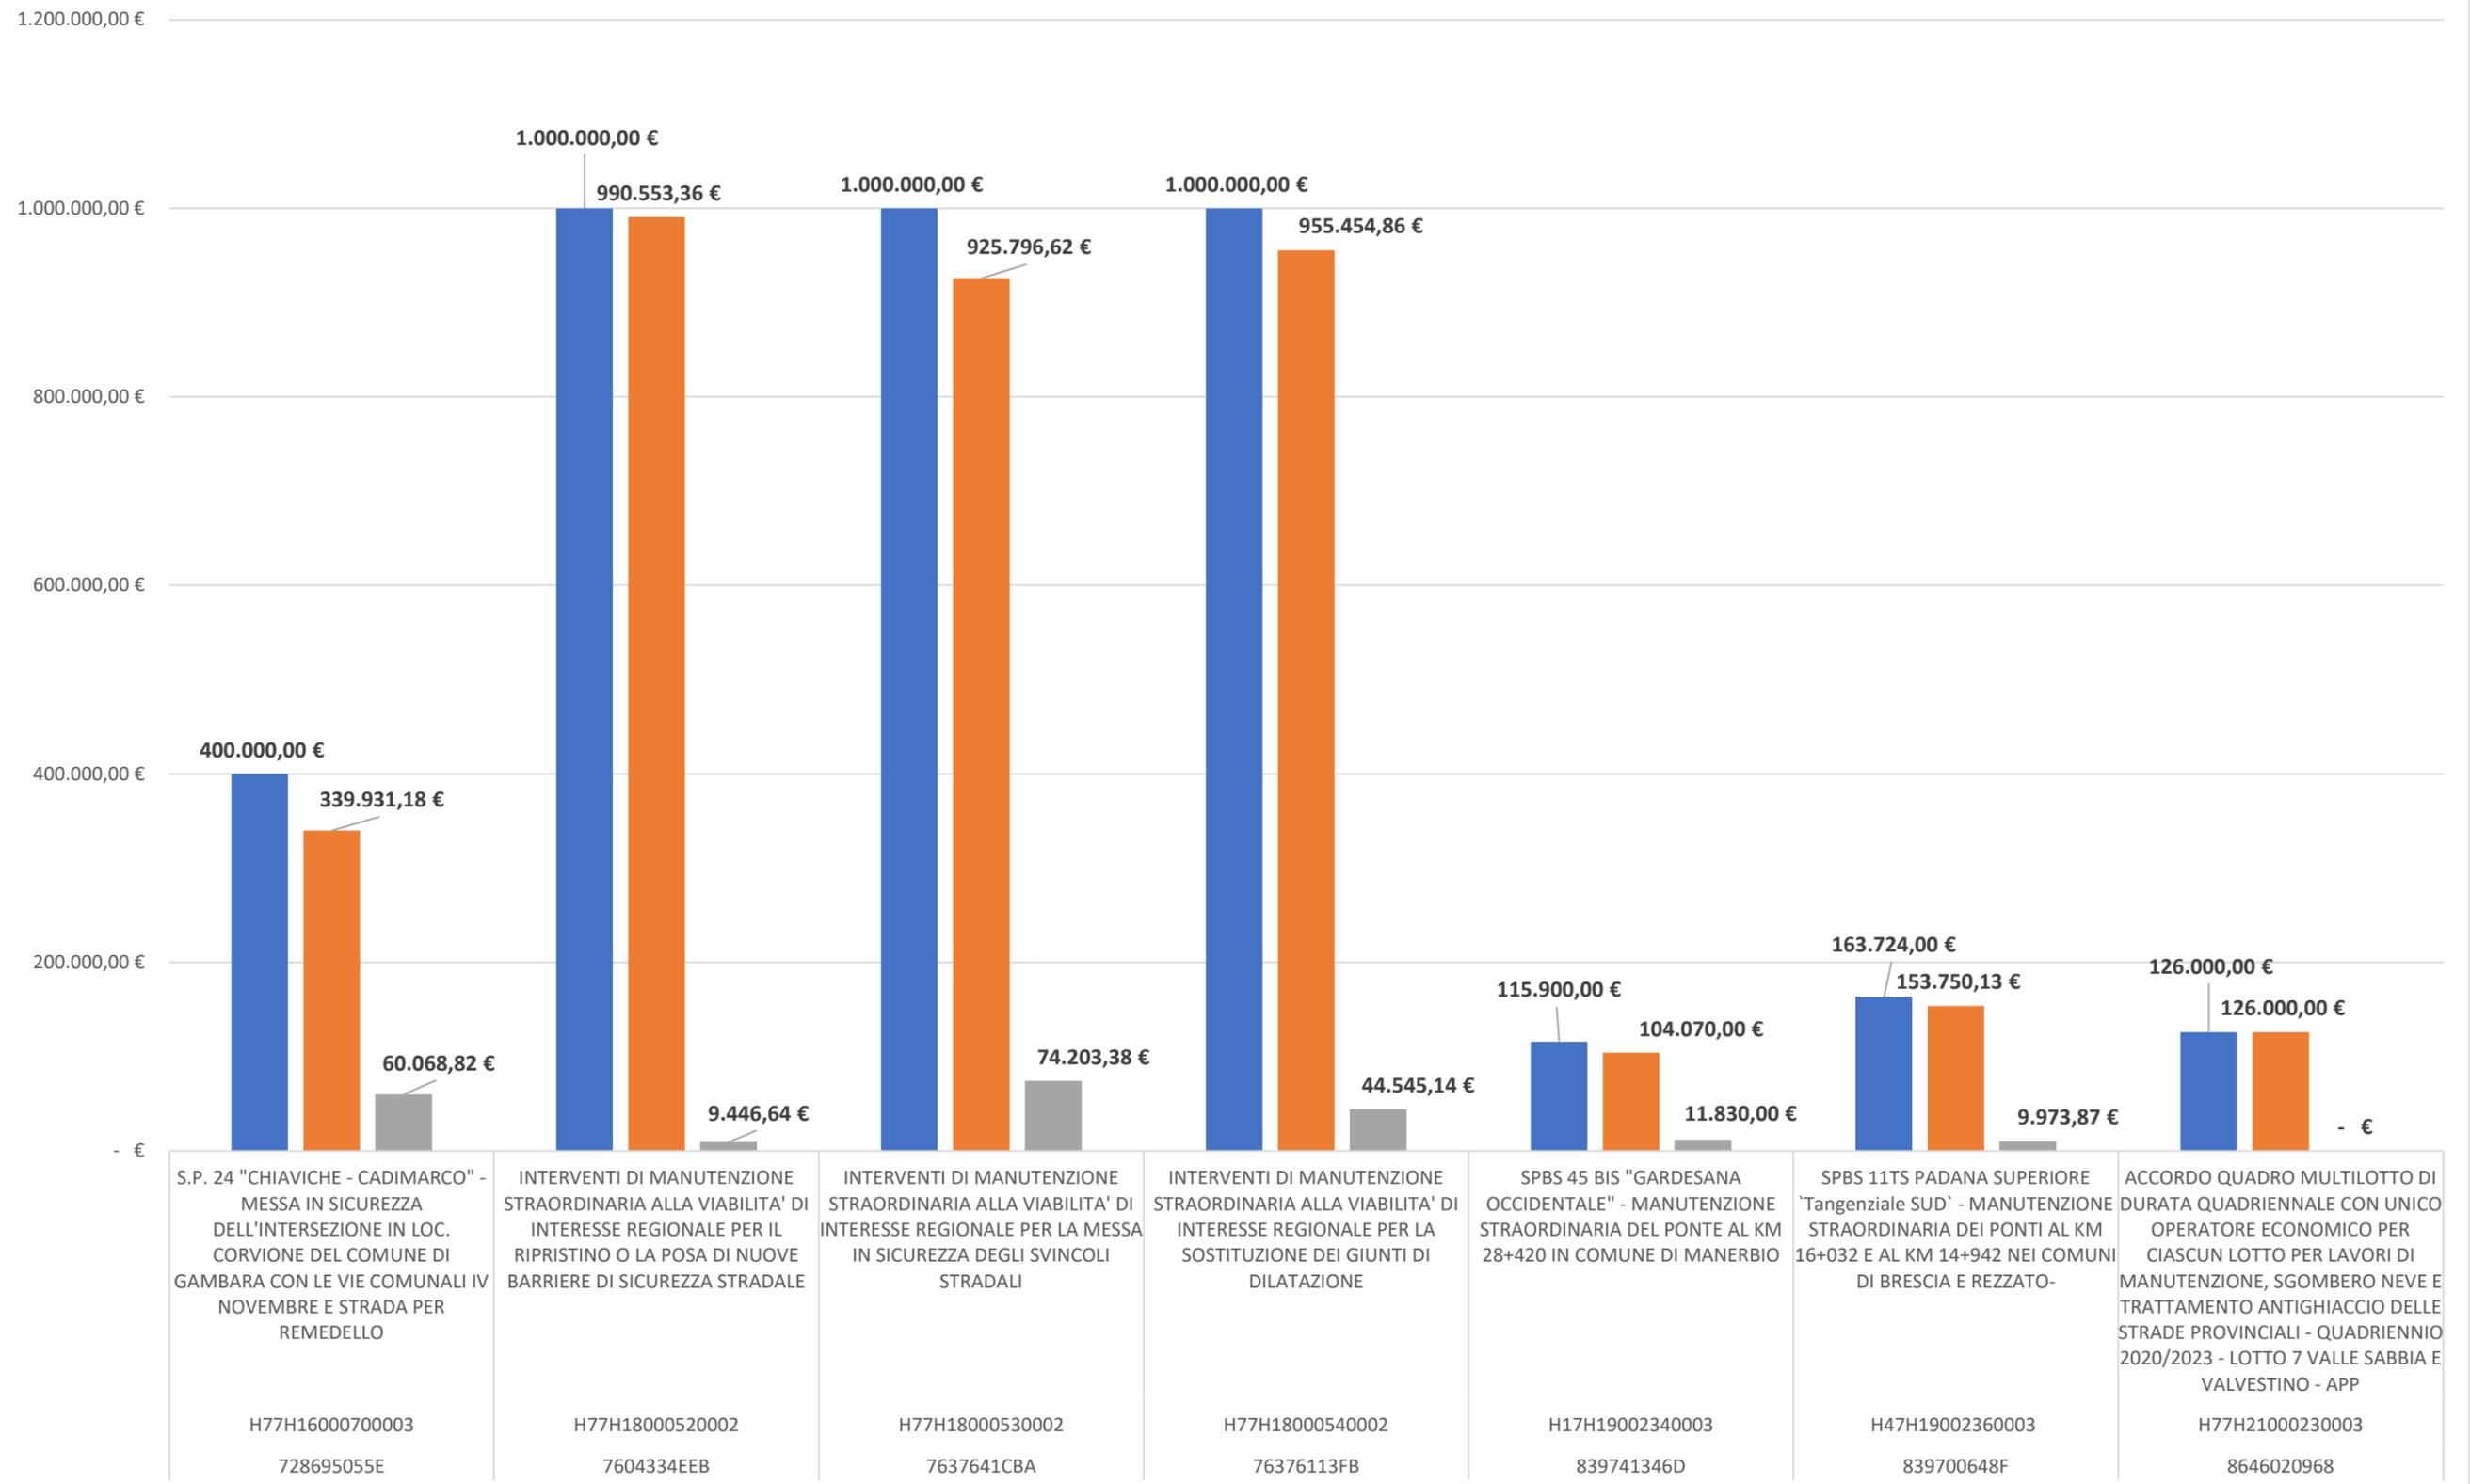

■ COSTO PROGETTO
■ COSTO EFFETTIVO
■ DIFFERENZA

SCOSTAMENTO TEMPI DI REALIZZAZIONE DELLE OPERE CONCLUSE DALL'1/1/2021 AL 30/11/2021

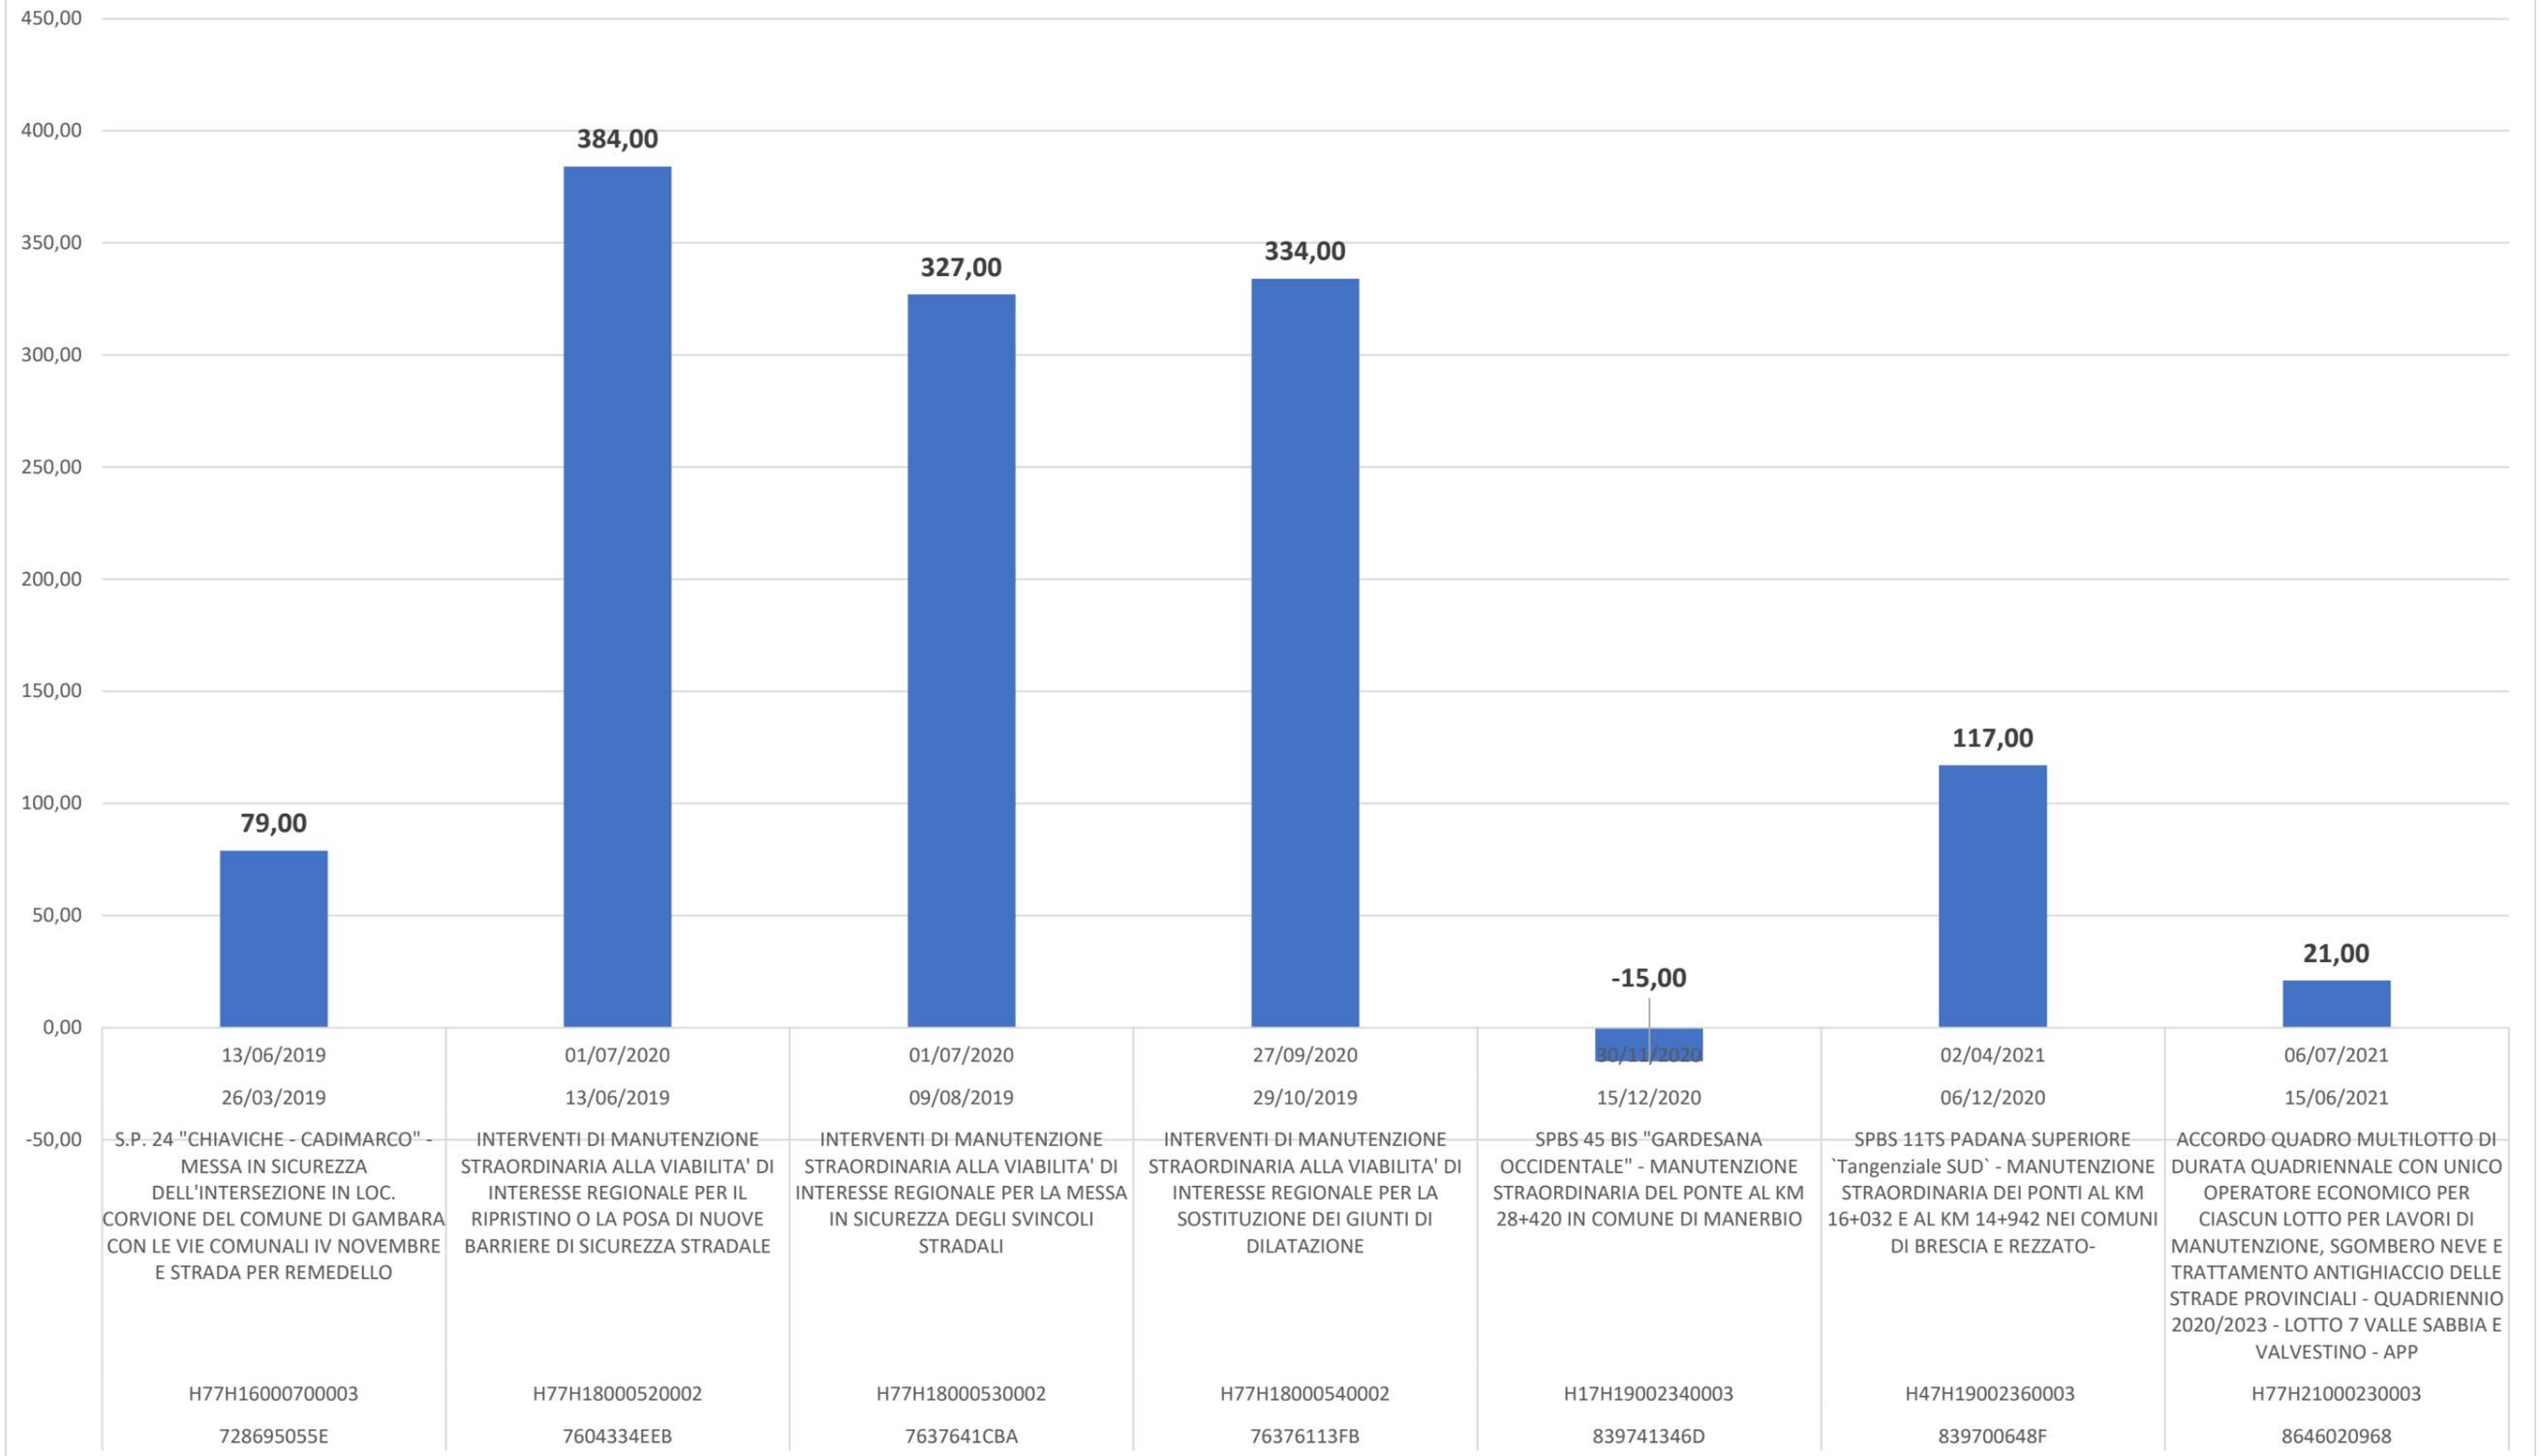

**INTERVENTI DI EDILIZIA STRADALE
CONCLUSI DAL 1/1/2021 AL 30/011/2021**

CIG	CUP	INTERVENTO	FINE LAVORI PREVISTA	FINE LAVORI EFFETTIVA	MAGGIORE O MINOR TEMPO DI REALIZZAZIONE	AUTORIZZATO	IMPORTO TOALE PROGTTO	COSTO GLOBALE INTERVENTO	MAGGIORE O MINORE COSTO INTERVENTO
728695055E	H77H16000700003	S.P. 24 "CHIAVICHE - CADIMARCO" - MESSA IN SICUREZZA DELL'INTERSEZIONE IN LOC. CORVIONE DEL COMUNE DI GAMBARA CON LE VIE COMUNALI IV NOVEMBRE E STRADA PER REMEDELLO	26/03/2019	13/06/2019	79,00	SOSPENSIONI E PROROGHE AUTORIZZATE	400.000,00 €	339.931,18 €	60.068,82 €
7604334EEB	H77H18000520002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER IL RIPRISTINO O LA POSA DI NUOVE BARRIERE DI SICUREZZA STRADALE	13/06/2019	01/07/2020	384,00	SOSPENSIONI E PROROGHE AUTORIZZATE	1.000.000,00 €	990.553,36 €	9.446,64 €
7637641CBA	H77H18000530002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA MESSA IN SICUREZZA DEGLI SVINCOLI STRADALI	09/08/2019	01/07/2020	327,00	SOSPENSIONI E PROROGHE AUTORIZZATE	1.000.000,00 €	925.796,62 €	74.203,38 €
76376113FB	H77H18000540002	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA VIABILITA' DI INTERESSE REGIONALE PER LA SOSTITUZIONE DEI GIUNTI DI DILATAZIONE	29/10/2019	27/09/2020	334,00	SOSPENSIONI E PROROGHE AUTORIZZATE	1.000.000,00 €	955.454,86 €	44.545,14 €
839741346D	H17H19002340003	SPBS 45 BIS "GARDESANA OCCIDENTALE" - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL PONTE AL KM 28+420 IN COMUNE DI MANERBIO	15/12/2020	30/11/2020	-15,00		115.900,00 €	104.070,00 €	11.830,00 €
839700648F	H47H19002360003	SPBS 11TS PADANA SUPERIORE `Tangenziale SUD` - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PONTI AL KM 16+032 E AL KM 14+942 NEI COMUNI DI BRESCIA E REZZATO-	06/12/2020	02/04/2021	117,00	SOSPENSIONI E PROROGHE AUTORIZZATE	163.724,00 €	153.750,13 €	9.973,87 €
8646020968	H77H21000230003	ACCORDO QUADRO MULTILOTTO DI DURATA QUADRIENNALE CON UNICO OPERATORE ECONOMICO PER CIASCUN LOTTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE, SGOMBERO NEVE E TRATTAMENTO ANTIGHIACCIO DELLE STRADE PROVINCIALI - QUADRIENNIO 2020/2023 - LOTTO 7 VALLE SABBIA E VALVESTINO - APPLICATIVO 3 SPBS 669 "DEL PASSO CROCEDOMINI" AL KM 5+080, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO FRANOSO AVVENUTO IL 23/01/2021, IN COMUNE DI BAGOLINO.	15/06/2021	06/07/2021	21,00	SOSPENSIONI E PROROGHE AUTORIZZATE	126.000,00 €	126.000,00 €	- €
